


Mobile Station 2 öffnen

25.4.2015/fg

- Auf Rückseite 2 Gummifüsse entfernen, 4 Schrauben TX8 lösen
- Auf Vorderseite roten Knopf entfernen, 1 Schraube TX8 lösen

- Encoder befestigen mit 2K-Kleber

- Verdrahtung:

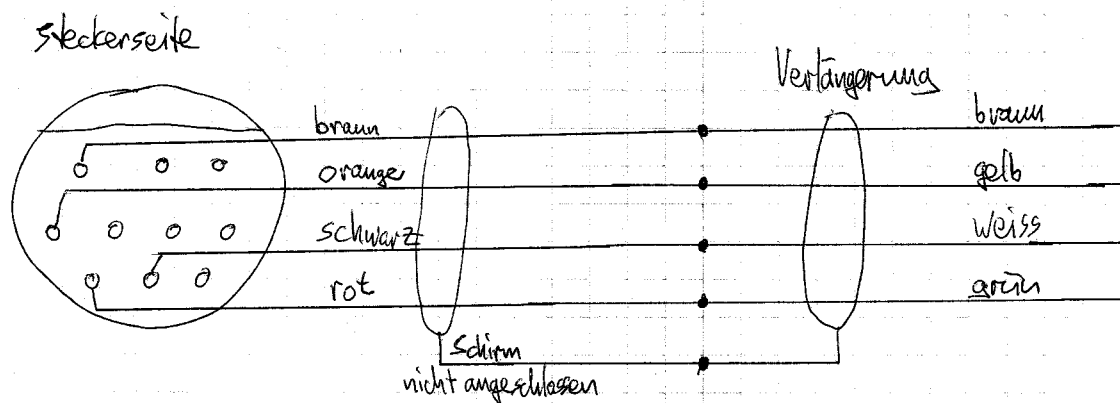

- Zugentlastungshülse ist vergossen.
 - Kabel beidseitig abschneiden
 - Ausbohren auf $\phi 4,5 \text{ mm}$
 - Neue Zugentlastung mit Kabelbinder erstellen.

